Nom	Travail
Phase - Hello World	**9j 4h**
Lexeur & parser(Hello World)	3j
Contextual Verification(Print)	**2j**
Compléter Environnnement	1j
Compléter la chaîne de vérification	1j
Code Generation (Print)	**1j 1h**
Compléter Decamain, DecaCo	1h
Implémenter CodeGenPrint pour Intliteral et Floatliteral	1j
Test Hello-World	1j
Préparation Suivi 1	**2j 3h**
rédaction Charte d'équipe	1h
Préparation des démos de Tests	2j
planning Prévisionnel	1h
Présentation de l'xtension (début biblio)	1h
Phase 2 : Langage sans objet	**13j 6h**
Parser - Intructions & expression	2j
Contextual Verification sans -objet	4j
Génération de code	5j
tests sans Objet	7h
Préparation suivi 2	**1j 7h**
mise à jour du planning	1h
schéma d'architecture de l'extension	3h
rédactionde la partie Algo	2h
Tableau des risques	5h
Préparation du rendu intermédiaire	4h
Phase3 :Langage Essentiel	**10j 4h**
Parser	1j 4h
Analyses & Contextual vérification classe	3j
Code Generation - objects & classe	4j
Test - Full Language	2j
Extension TRIGO	**17j**
Documentation	4j
Implementation	3j
extension research	10j
Documentation	**3j**
Manuel utilisateur	5h
Documentation de conception	4h
Documentation de validation	5h
Analyse impact énergétique	5h
Bilan gestion équipe & projet	5h

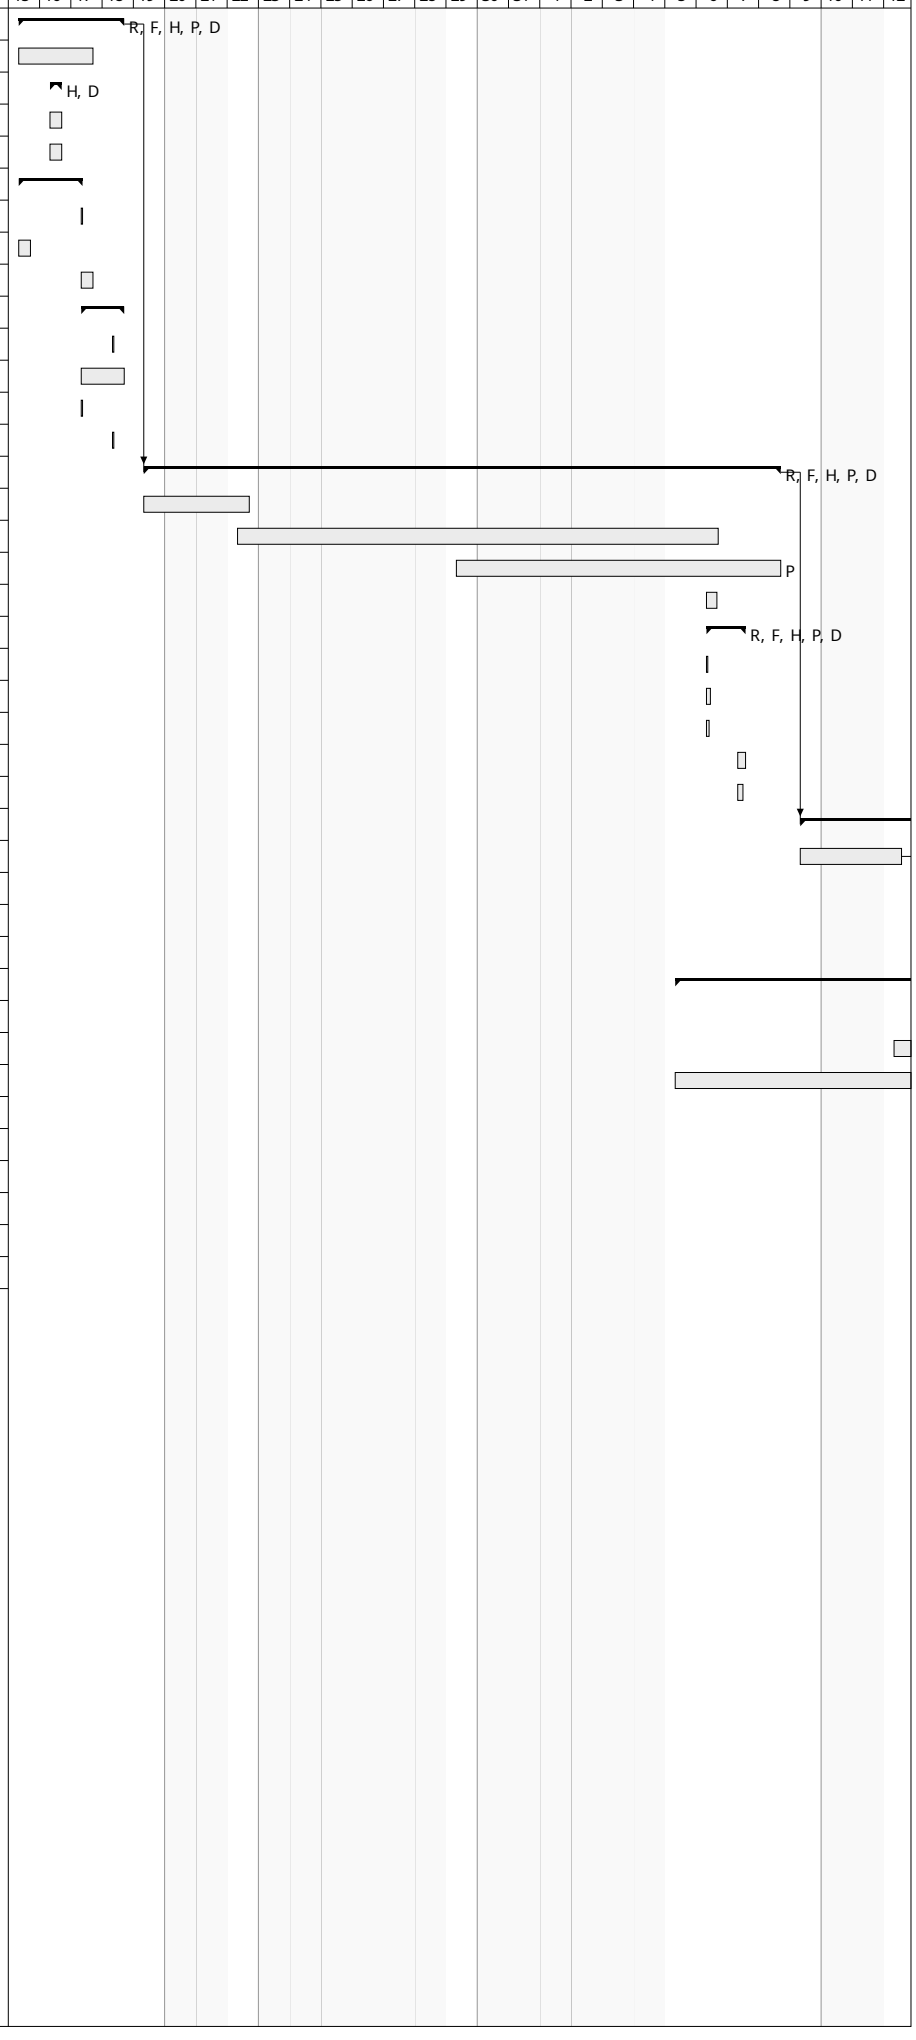

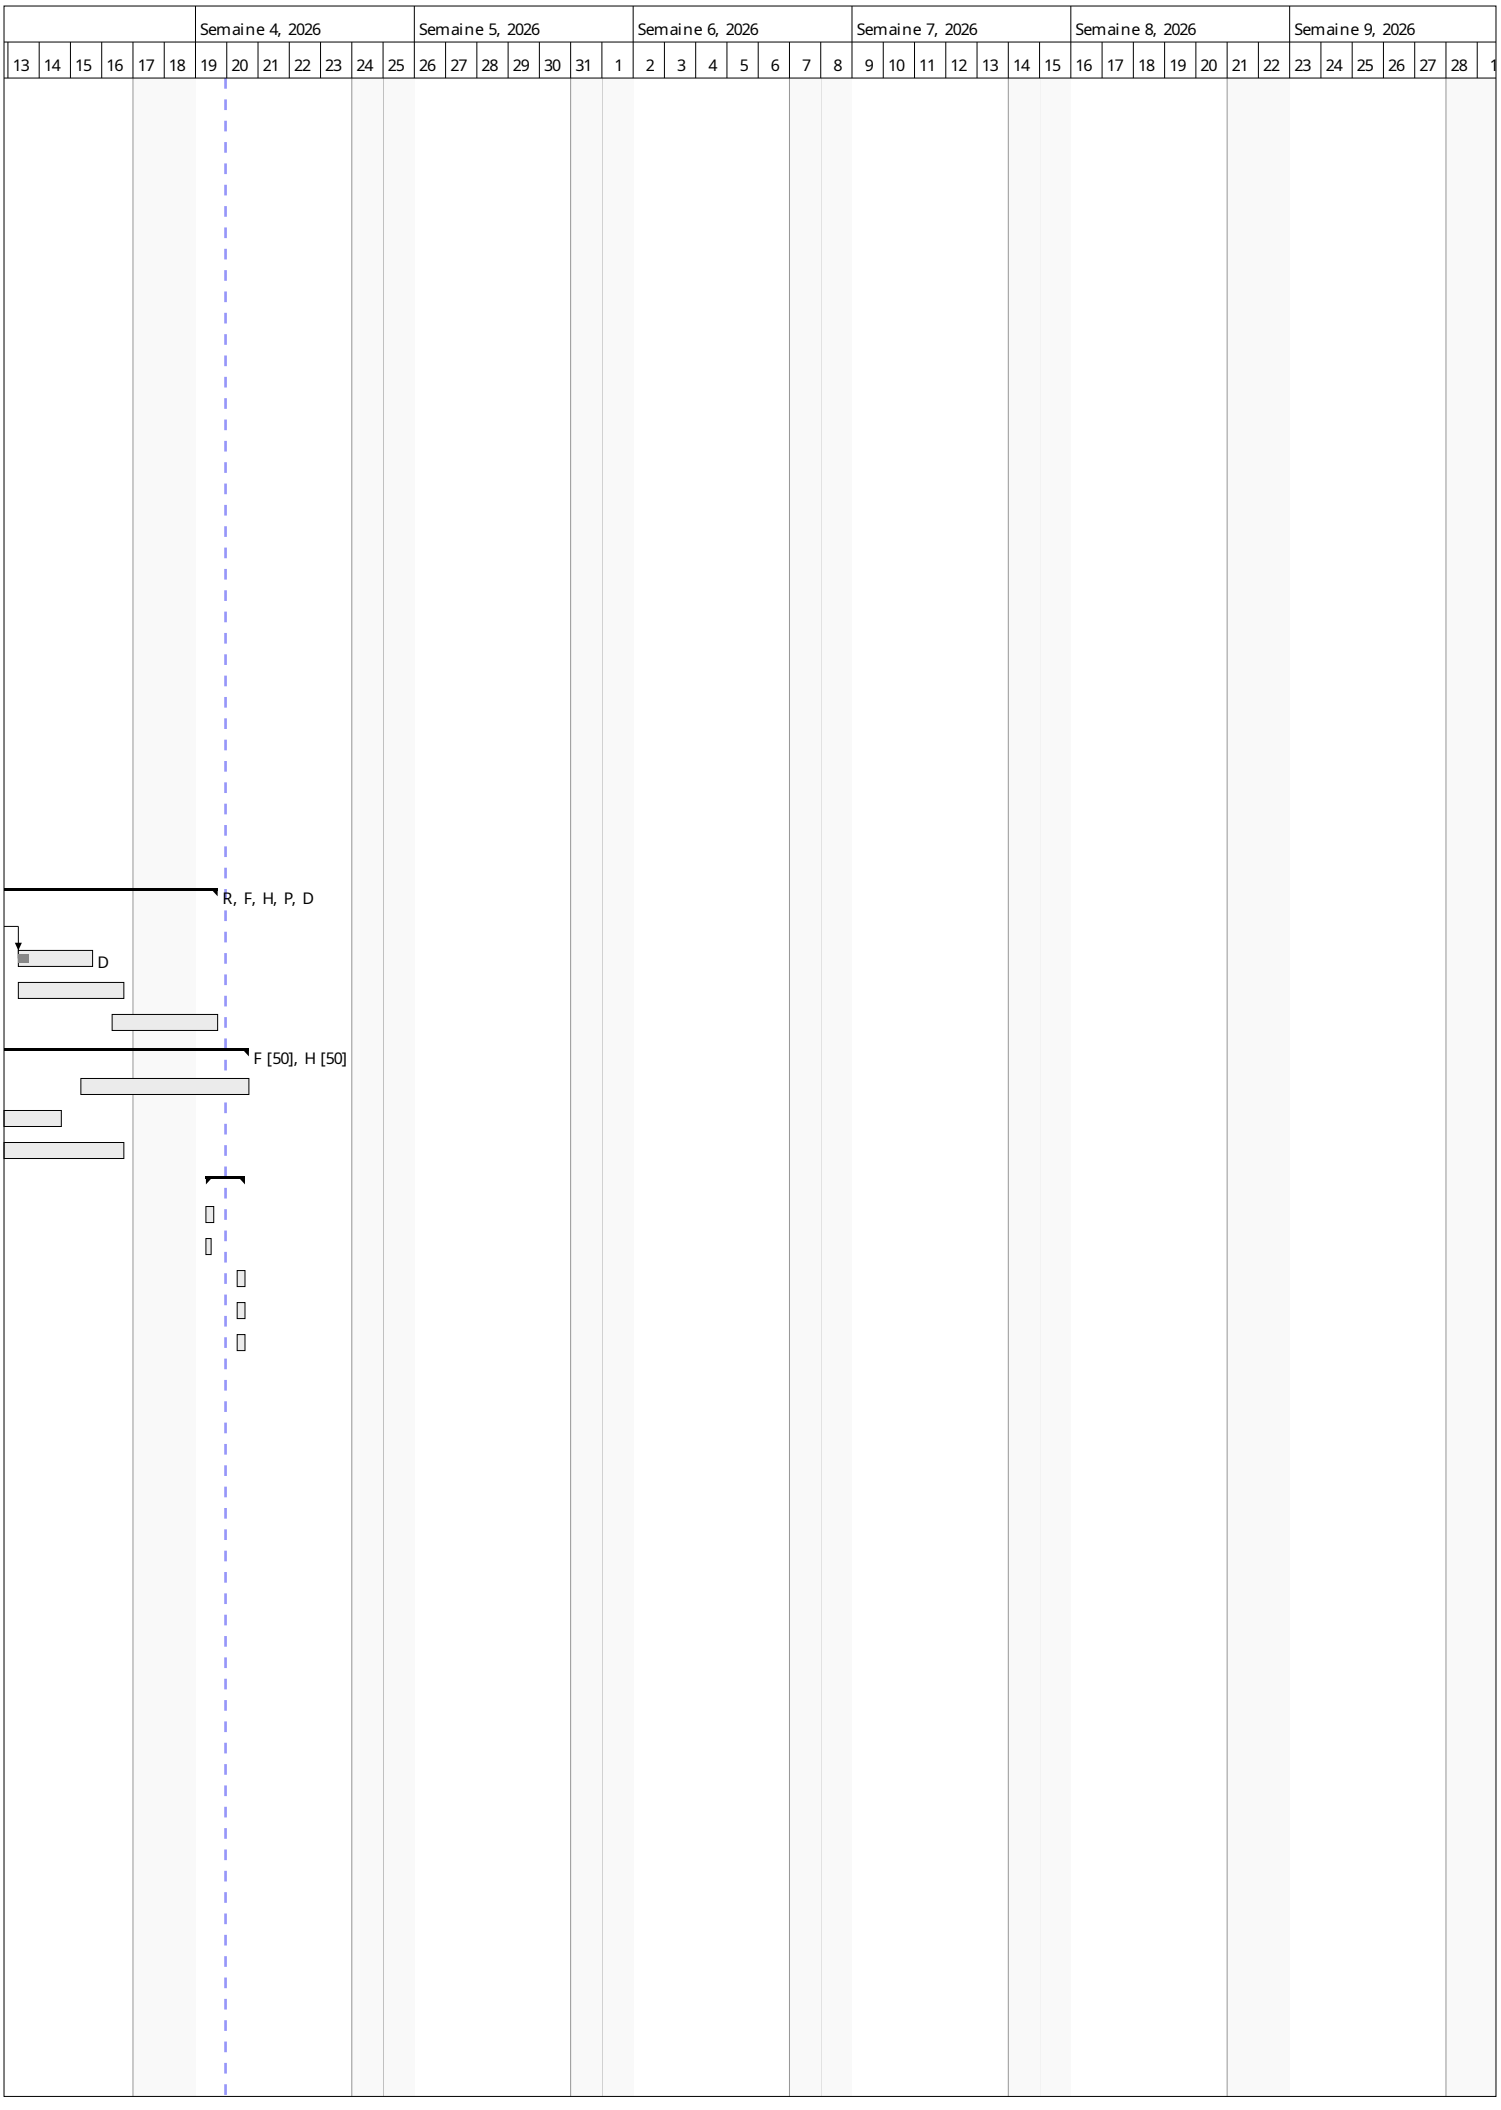
Semaine 4, 2026
Semaine 5, 2026
Semaine 6, 2026
Semaine 7, 2026
Semaine 8, 2026
Semaine 9, 2026
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
R, F, H, P, D
D
F [50], H [50]

TPÉ	Nom	Démarré	Terminé	Travail	Durée	Latitude	Coût	Assigné à	État d'avancement (%)
1	**Phase - Hello World**	**déc. 15**	**déc. 18**	**9j 4h**	**4j**	**2j 2h**	**0**	D, F, H, P, R	0
1.1	Lexeur & parser(Hello World)	déc. 15	déc. 17	3j	3j	3j 2h	0		0
1.2	**Contextual Verification(Print)**	**déc. 16**	**déc. 16**	**2j**	**1j**	**4j 2h**	**0**	D, H	0
1.2.1	Compléter Environnnement	déc. 16	déc. 16	1j	1j	4j 2h	0		0
1.2.2	Compléter la chaîne de vérification	déc. 16	déc. 16	1j	1j	4j 2h	0		0
1.3	**Code Generation (Print)**	**déc. 15**	**déc. 17**	**1j 1h**	**2j 1h**	**4j 1h**	**0**		0
1.3.1	Compléter Decamain, DecaCo	déc. 17	déc. 17	1h	1h	4j 1h	0		0
1.3.2	Implémenter CodeGenPrint pour Intliteral et Floatliteral	déc. 15	déc. 15	1j	1j	5j 2h	0		0
1.4	Test Hello-World	déc. 17	déc. 17	1j	1j	3j 2h	0		0
1.5	**Préparation Suivi 1**	**déc. 17**	**déc. 18**	**2j 3h**	**2j**	**2j 2h**	**0**		0
1.5.1	rédaction Charte d'équipe	déc. 18	déc. 18	1h	1h	3j 1h	0		0
1.5.2	Préparation des démos de Tests	déc. 17	déc. 18	2j	2j	2j 2h	0		0
1.5.3	planning Prévisionnel	déc. 17	déc. 17	1h	1h	4j 1h	0		0
1.5.4	Présentation de l'xtension (début biblio)	déc. 18	déc. 18	1h	1h	3j 1h	0		0
2	**Phase 2 : Langage sans objet**	**déc. 19**	**janv. 8**	**13j 6h**	**7j**	**3j**	**0**	D, F, H, P, R	0
2.1	Parser - Intructions & expression	déc. 19	déc. 22	2j	2j	8j	0		0
2.2	Contextual Verification sans -objet	déc. 22	janv. 6	4j	4j	5j	0		0
2.3	Génération de code	déc. 29	janv. 8	5j	5j	3j	0	P	0
2.4	tests sans Objet	janv. 6	janv. 6	7h	7h	5j 1h	0		0
2.5	**Préparation suivi 2**	**janv. 6**	**janv. 7**	**1j 7h**	**1j 5h**	**4j 3h**	**0**	D, F, H, P, R	0
2.5.1	mise à jour du planning	janv. 6	janv. 6	1h	1h	5j 7h	0		0
2.5.2	schéma d'architecture de l'extension	janv. 6	janv. 6	3h	3h	5j 5h	0		0
2.5.3	rédactionde la partie Algo	janv. 6	janv. 6	2h	2h	5j 6h	0		0
2.5.4	Tableau des risques	janv. 7	janv. 7	5h	5h	4j 3h	0		0
2.5.5	Préparation du rendu intermédiaire	janv. 7	janv. 7	4h	4h	4j 4h	0		0
3	**Phase3 :Langage Essentiel**	**janv. 9**	**janv. 19**	**10j 4h**	**7j**	**1j**	**0**	D, F, H, P, R	0
3.1	Parser	janv. 9	janv. 12	1j 4h	1j 4h	4j 3h	0		0
3.2	Analyses & Contextual vérification classe	janv. 13	janv. 15	3j	3j	3j	0	D	14
3.3	Code Generation - objects & classe	janv. 13	janv. 16	4j	4j	2j	0		0
3.4	Test - Full Language	janv. 16	janv. 19	2j	2j	1j	0		0
4	**Extension TRIGO**	**janv. 5**	**janv. 20**	**17j**	**12j**		**0**	F, H	0
4.1	Documentation	janv. 15	janv. 20	4j	4j		0		0
4.2	Implementation	janv. 12	janv. 14	3j	3j	4j	0		0
4.3	extension research	janv. 5	janv. 16	10j	10j	2j	0		0
5	**Documentation**	**janv. 19**	**janv. 20**	**3j**	**1j 5h**	**3h**	**0**		0
5.1	Manuel utilisateur	janv. 19	janv. 19	5h	5h	1j 3h	0		0
5.2	Documentation de conception	janv. 19	janv. 19	4h	4h	1j 4h	0		0
5.3	Documentation de validation	janv. 20	janv. 20	5h	5h	3h	0		0
5.4	Analyse impact énergétique	janv. 20	janv. 20	5h	5h	3h	0		0
5.5	Bilan gestion équipe & projet	janv. 20	janv. 20	5h	5h	3h	0		0

Nom	Nom abrégé	Type	Groupe	Adresse électronique	Coût
Romain	R	Travail			0
Famagan	F	Travail			0
Hugo	H	Travail			0
Placide	P	Travail			0
David	D	Travail			0
