Nom	Travail
Phase - Hello World	**9j 4h**
Phase 2 : Langage sans objet	**13j 6h**
Phase3 :Langage Essentiel	**10j 4h**
Parser	1j 4h
Analyses & Contextual vérification classe	3j
Code Generation - objects & classe	4j
Test - Full Language	2j
Extension TRIGO	**17j**
Documentation	4j
Implementation	3j
extension research	10j
Documentation	**3j**
Manuel utilisateur	5h
Documentation de conception	4h
Documentation de validation	5h
Analyse impact énergétique	5h
Bilan gestion équipe & projet	5h

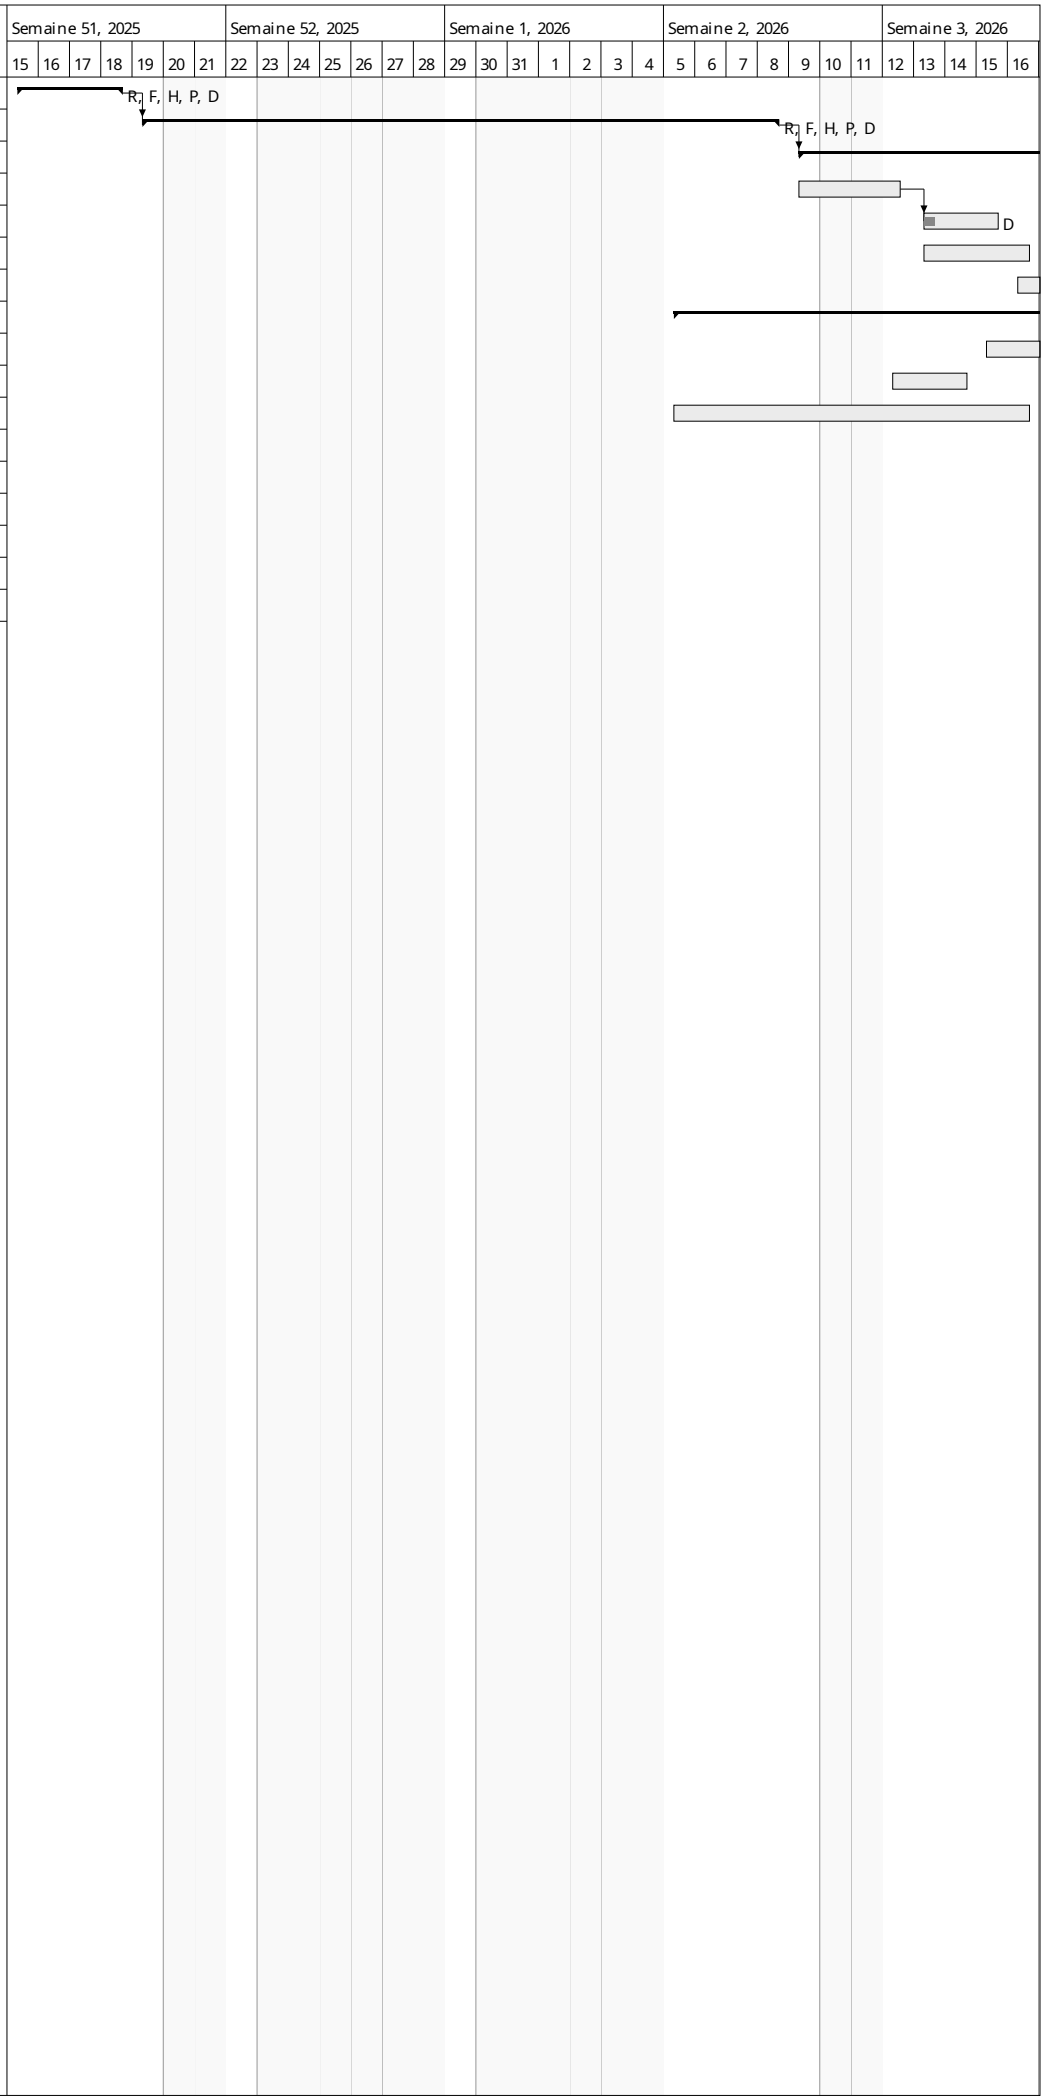

Semaine 4, 2026
Semaine 5, 2026
Semaine 6, 2026
Semaine 7, 2026
Semaine 8, 2026
Semaine 9, 2026
Semaine 10, 2..
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5
R, F, H, P, D
F [50], H [50]

TPÉ	Nom	Démarré	Terminé	Travail	Durée	Latitude	Coût	Assigné à	État d'avancement (%)
1	**Phase - Hello World**	**déc. 15**	**déc. 18**	**9j 4h**	**4j**	**2j 2h**	**0**	D, F, H, P, R	0
1.1	Lexeur & parser(Hello World)	déc. 15	déc. 17	3j	3j	3j 2h	0		0
1.2	**Contextual Verification(Print)**	**déc. 16**	**déc. 16**	**2j**	**1j**	**4j 2h**	**0**	D, H	0
1.2.1	Compléter Environnnement	déc. 16	déc. 16	1j	1j	4j 2h	0		0
1.2.2	Compléter la chaîne de vérification	déc. 16	déc. 16	1j	1j	4j 2h	0		0
1.3	**Code Generation (Print)**	**déc. 15**	**déc. 17**	**1j 1h**	**2j 1h**	**4j 1h**	**0**		0
1.3.1	Compléter Decamain, DecaCo	déc. 17	déc. 17	1h	1h	4j 1h	0		0
1.3.2	Implémenter CodeGenPrint pour Intliteral et Floatliteral	déc. 15	déc. 15	1j	1j	5j 2h	0		0
1.4	Test Hello-World	déc. 17	déc. 17	1j	1j	3j 2h	0		0
1.5	**Préparation Suivi 1**	**déc. 17**	**déc. 18**	**2j 3h**	**2j**	**2j 2h**	**0**		0
1.5.1	rédaction Charte d'équipe	déc. 18	déc. 18	1h	1h	3j 1h	0		0
1.5.2	Préparation des démos de Tests	déc. 17	déc. 18	2j	2j	2j 2h	0		0
1.5.3	planning Prévisionnel	déc. 17	déc. 17	1h	1h	4j 1h	0		0
1.5.4	Présentation de l'xtension (début biblio)	déc. 18	déc. 18	1h	1h	3j 1h	0		0
2	**Phase 2 : Langage sans objet**	**déc. 19**	**janv. 8**	**13j 6h**	**7j**	**3j**	**0**	D, F, H, P, R	0
2.1	Parser - Intructions & expression	déc. 19	déc. 22	2j	2j	8j	0		0
2.2	Contextual Verification sans -objet	déc. 22	janv. 6	4j	4j	5j	0		0
2.3	Génération de code	déc. 29	janv. 8	5j	5j	3j	0	P	0
2.4	tests sans Objet	janv. 6	janv. 6	7h	7h	5j 1h	0		0
2.5	**Préparation suivi 2**	**janv. 6**	**janv. 7**	**1j 7h**	**1j 5h**	**4j 3h**	**0**	D, F, H, P, R	0
2.5.1	mise à jour du planning	janv. 6	janv. 6	1h	1h	5j 7h	0		0
2.5.2	schéma d'architecture de l'extension	janv. 6	janv. 6	3h	3h	5j 5h	0		0
2.5.3	rédactionde la partie Algo	janv. 6	janv. 6	2h	2h	5j 6h	0		0
2.5.4	Tableau des risques	janv. 7	janv. 7	5h	5h	4j 3h	0		0
2.5.5	Préparation du rendu intermédiaire	janv. 7	janv. 7	4h	4h	4j 4h	0		0
3	**Phase3 :Langage Essentiel**	**janv. 9**	**janv. 19**	**10j 4h**	**7j**	**1j**	**0**	D, F, H, P, R	0
3.1	Parser	janv. 9	janv. 12	1j 4h	1j 4h	4j 3h	0		0
3.2	Analyses & Contextual vérification classe	janv. 13	janv. 15	3j	3j	3j	0	D	14
3.3	Code Generation - objects & classe	janv. 13	janv. 16	4j	4j	2j	0		0
3.4	Test - Full Language	janv. 16	janv. 19	2j	2j	1j	0		0
4	**Extension TRIGO**	**janv. 5**	**janv. 20**	**17j**	**12j**		**0**	F, H	0
4.1	Documentation	janv. 15	janv. 20	4j	4j		0		0
4.2	Implementation	janv. 12	janv. 14	3j	3j	4j	0		0
4.3	extension research	janv. 5	janv. 16	10j	10j	2j	0		0
5	**Documentation**	**janv. 19**	**janv. 20**	**3j**	**1j 5h**	**3h**	**0**		0
5.1	Manuel utilisateur	janv. 19	janv. 19	5h	5h	1j 3h	0		0
5.2	Documentation de conception	janv. 19	janv. 19	4h	4h	1j 4h	0		0
5.3	Documentation de validation	janv. 20	janv. 20	5h	5h	3h	0		0
5.4	Analyse impact énergétique	janv. 20	janv. 20	5h	5h	3h	0		0
5.5	Bilan gestion équipe & projet	janv. 20	janv. 20	5h	5h	3h	0		0

Nom	Nom abrégé	Type	Groupe	Adresse électronique	Coût
Romain	R	Travail			0
Famagan	F	Travail			0
Hugo	H	Travail			0
Placide	P	Travail			0
David	D	Travail			0
