Nom	Travail
Phase 1 - Hello World	**11j 4h**
Phase 2 - Langage sans-objet	**15j 5h**
¨réparation Suivi 2	**2j 3h**
mise à jour de planning	1h
schéma d'architecture de l'extension	3h
rédactionde la partie Algo	3h
Tableau des risques	5h
Préparation du rendu intermédiaire	5h
Rendu intermédiaire - sans-objet	
Phase 3 - Langage essentiel	**13j 6h**
Parser	2j
Analysis & Contextual Verification - classes	4j
Code Generation - objects & classes	4j 6h
Tests - full language	3j
Phase 4 - Extension	**18j**
Documentation	4j
Extension implementation	4j
Extension research	10j
Phase 5 - Documentation	**4j 2h**
Manuel utilisateur	1j
Documentation de conception	5h 30...
Documentation de validation	6h
Analyse impact énergétique	6h
Bilan gestion équipe & projet	5h 30...

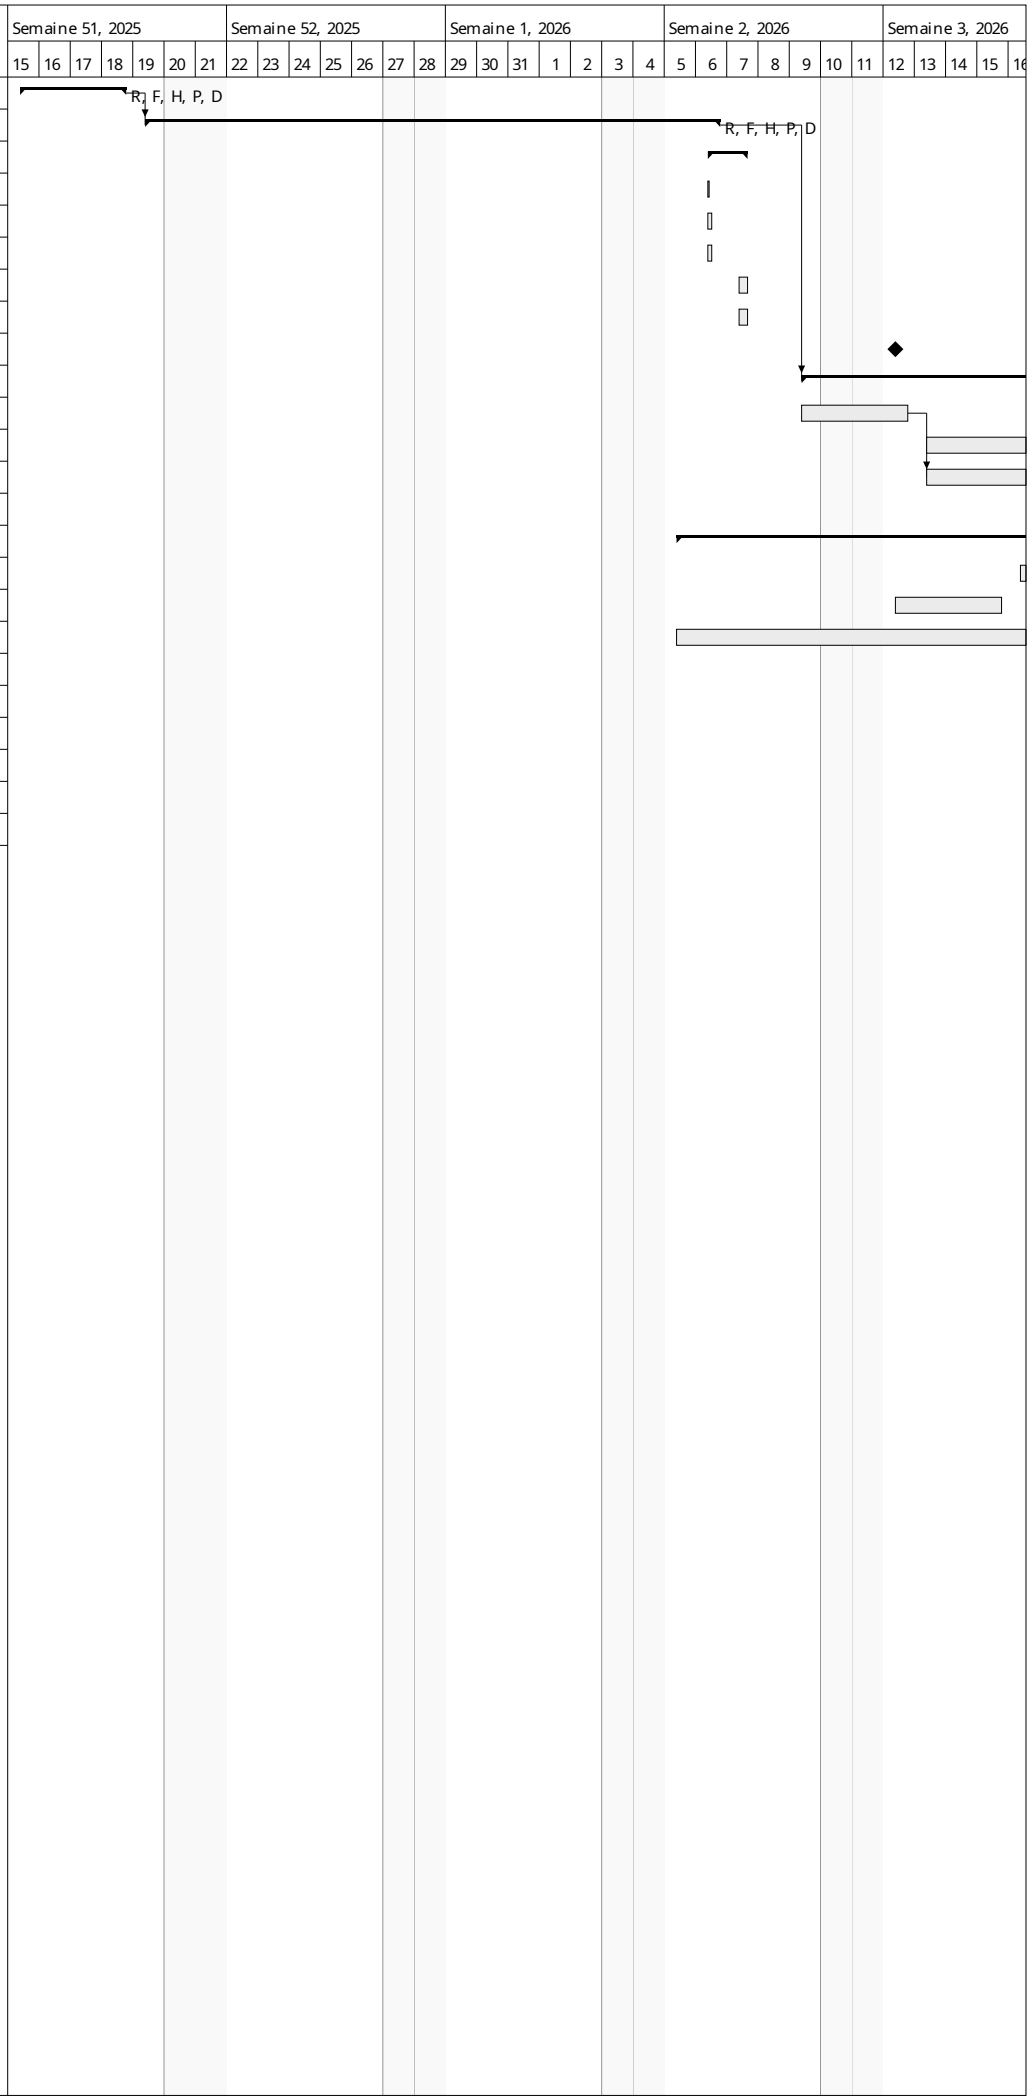

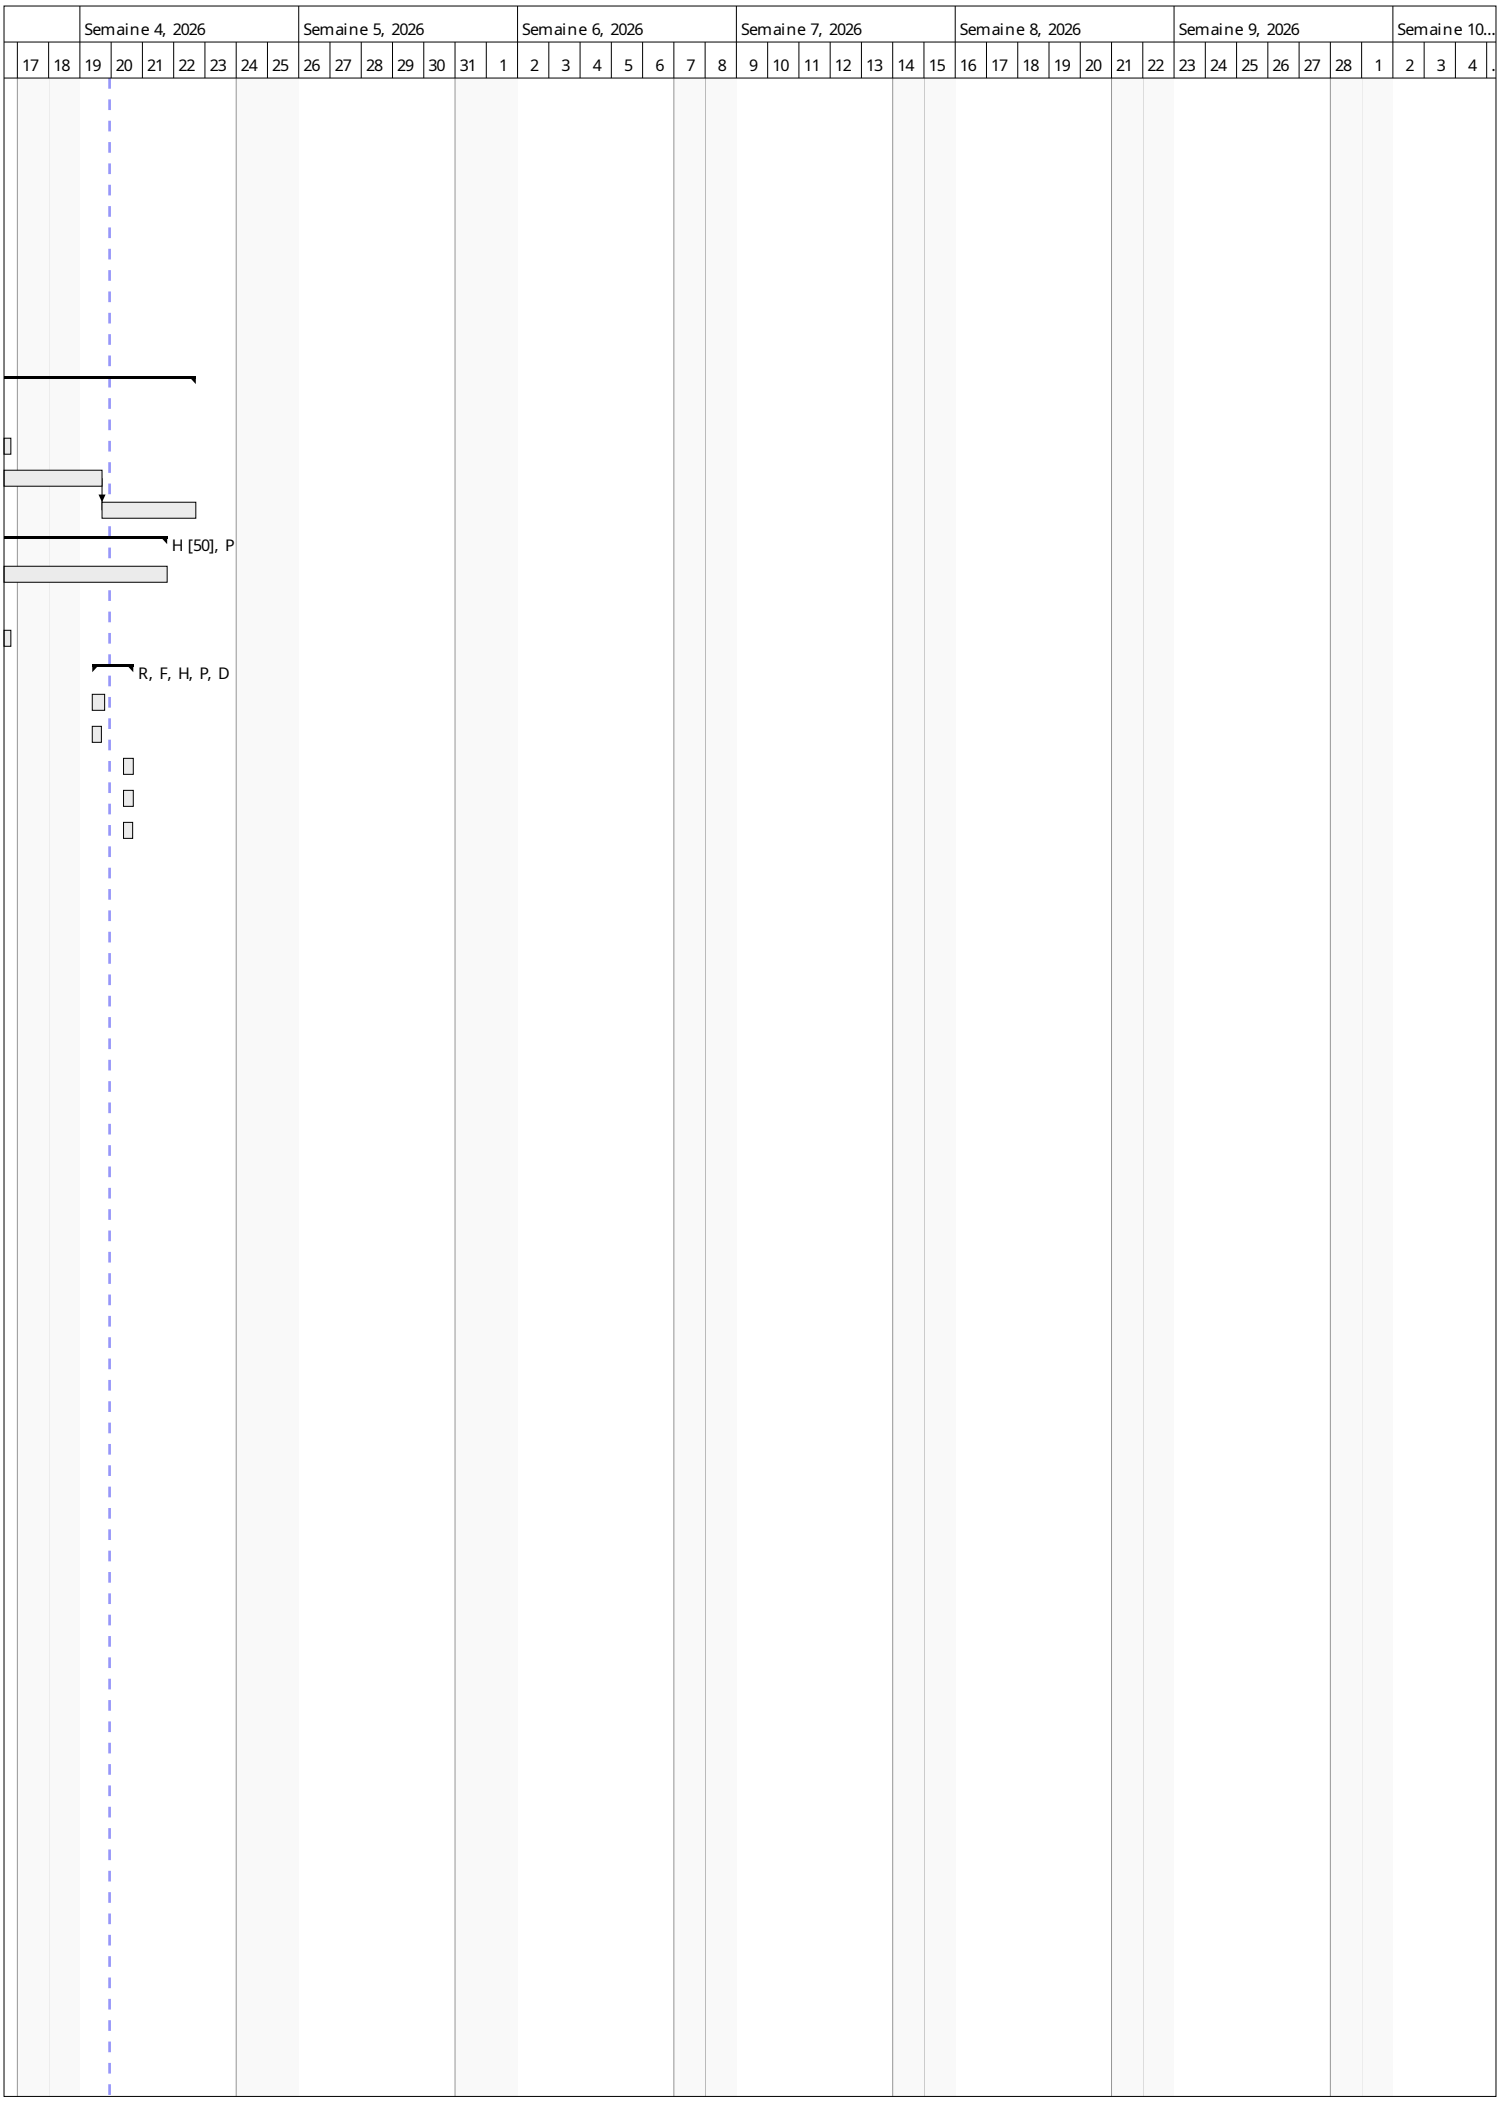
Semaine 4, 2026
Semaine 5, 2026
Semaine 6, 2026
Semaine 7, 2026
Semaine 8, 2026
Semaine 9, 2026
Semaine 10...
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4
H [50], P
R, F, H, P, D

TPÉ	Nom	Démarré	Terminé	Travail	Durée	Latitude	Coût	Assigné à	État d'avancement (%)
1	**Phase 1 - Hello World**	**déc. 15**	**déc. 18**	**11j 4h**	**4j**	**6j**	**0**	D, F, H, P, R	0
1.1	Lexer & Parser (Hello World)	déc. 15	déc. 16	4j	1j 2h	8j 4h	0	D, H, P	100
1.2	**Contextual Verfication (print)**	**déc. 16**	**déc. 16**	**2j**	**1j**	**8j**	**0**	D, H	0
1.2.1	Compléter Environnement	déc. 16	déc. 16	1j	1j	8j	0		0
1.2.2	Compléter la chaîne de vérificatio	déc. 16	déc. 16	1j	1j	8j	0		0
1.3	**Code Generatio n (Print)**	**déc. 16**	**déc. 17**	**2j**	**1j 5h**	**7j 2h**	**0**	D, F, H, P, R	0
1.3.1	Compléter Decamain, DecaCo	déc. 17	déc. 17	2h	2h	7j 5h	0		0
1.3.2	Implémenter CodeGenPrint pour Intliteral et Floatliteral	déc. 16	déc. 17	1j 5h	1j 5h	7j 2h	0		0
1.4	Tests - Hello World	déc. 17	déc. 18	1j 1h	1j 1h	6j 6h	0		10
1.5	**Préparation Suivi 1**	**déc. 17**	**déc. 18**	**2j 3h**	**2j**	**6j**	**0**	D, F, P, R	0
1.5.1	Rédiger la charte d'équipe	déc. 18	déc. 18	1h	1h	6j 6h	0		90
1.5.2	Préparer une démo de tests	déc. 17	déc. 18	2j	2j	6j	0		100
1.5.3	Planning prévisionnel	déc. 17	déc. 17	1h	1h	7j 6h	0		80
1.5.4	Présentation de l'extension (début biblio)	déc. 18	déc. 18	1h	1h	6j 6h	0		0
2	**Phase 2 - Langage sans-objet**	**déc. 19**	**janv. 6**	**15j 5h**	**13j**	**2j**	**0**	D, F, H, P, R	0
2.1	Parser - instructions & expressions	déc. 19	déc. 23	2j 5h	2j 5h	7j 2h	0		0
2.2	Contextual Verification - sans-objet	déc. 23	déc. 30	5j	5j	7j 2h	0		0
2.3	Code Generation - sans-objet	déc. 29	janv. 6	7j	7j	2j	0		0
2.4	Tests - sans-objet	janv. 6	janv. 6	1j	1j	2j	0		0
3	**¨réparation Suivi 2**	**janv. 6**	**janv. 7**	**2j 3h**	**1j 5h**	**11j 1h**	**0**		0
3.1	mise à jour de planning	janv. 6	janv. 6	1h	1h	12j 5h	0		0
3.2	schéma d'architecture de l'extension	janv. 6	janv. 6	3h	3h	12j 3h	0		0
3.3	rédactionde la partie Algo	janv. 6	janv. 6	3h	3h	12j 3h	0		0
3.4	Tableau des risques	janv. 7	janv. 7	5h	5h	11j 1h	0		0
3.5	Préparation du rendu intermédiaire	janv. 7	janv. 7	5h	5h	11j 1h	0		0
4	Rendu intermédiaire - sans-objet	janv. 12	janv. 12	N/D	N/D	8j 6h	0		0
5	**Phase 3 - Langage essentiel**	**janv. 9**	**janv. 22**	**13j 6h**	**9j 6h**		**0**		0
5.1	Parser	janv. 9	janv. 12	2j	2j		0		0
5.2	Analysis & Contextual Verification - classes	janv. 13	janv. 16	4j	4j	3j 6h	0		0
5.3	Code Generation - objects & classes	janv. 13	janv. 19	4j 6h	4j 6h		0		0
5.4	Tests - full language	janv. 19	janv. 22	3j	3j		0		0
6	**Phase 4 - Extension**	**janv. 5**	**janv. 21**	**18j**	**13j**	**6h**	**0**	H, P	0
6.1	Documentation	janv. 16	janv. 21	4j	4j	6h	0		0
6.2	Extension implementation	janv. 12	janv. 15	4j	4j	4j 6h	0		0
6.3	Extension research	janv. 5	janv. 16	10j	10j	3j 6h	0		0
7	**Phase 5 - Documentation**	**janv. 19**	**janv. 20**	**4j 2h**	**1j 6h**	**2j**	**0**	D, F, H, P, R	0
7.1	Manuel utilisateur	janv. 19	janv. 19	1j	1j	2j 6h	0		0
7.2	Documentation de conception	janv. 19	janv. 19	5h 30min	5h 30min	3j	0		0
7.3	Documentation de validation	janv. 20	janv. 20	6h	6h	2j	0		0
7.4	Analyse impact énergétique	janv. 20	janv. 20	6h	6h	2j	0		0
7.5	Bilan gestion équipe & projet	janv. 20	janv. 20	5h 30min	5h 30min	2j	0		0

Nom	Nom abrégé	Type	Groupe	Adresse électronique	Coût
Romain	R	Travail			0
Famagan	F	Travail			0
Hugo	H	Travail			0
Placide	P	Travail			0
David	D	Travail			0
